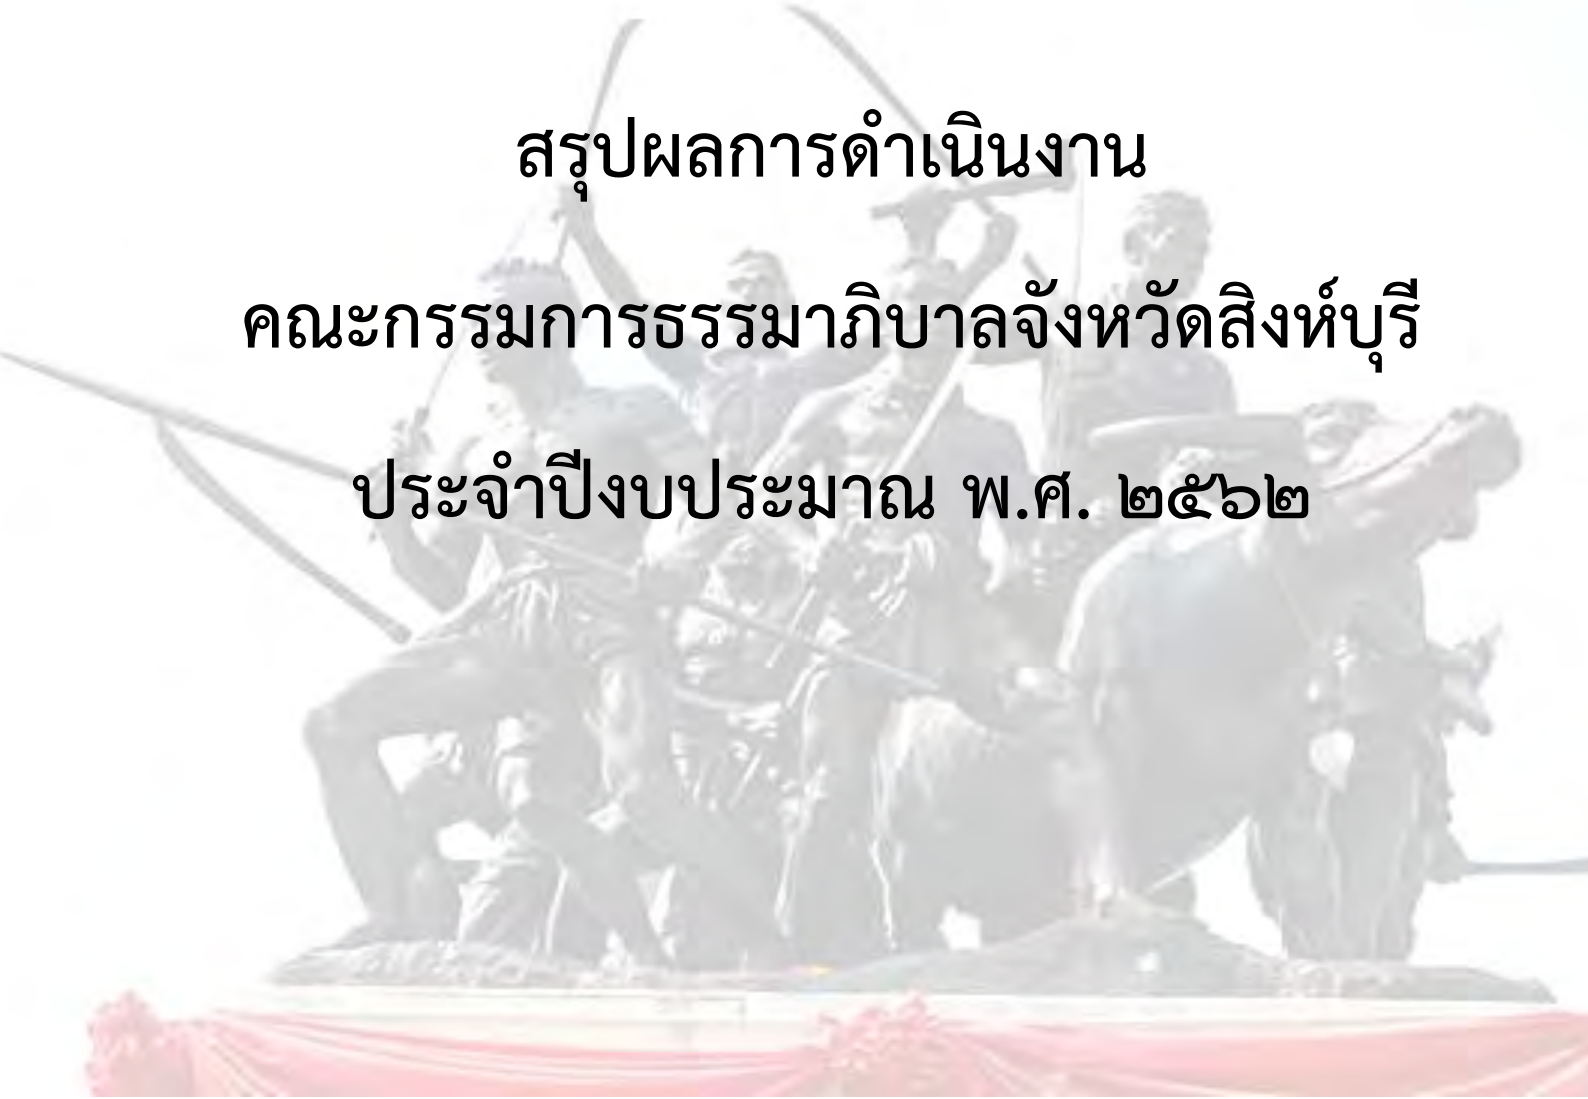


สรุปผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดทำโดย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

กันยายน ๒๕๖๒

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๑ ได้กำหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. ทำหน้าที่ในการสอดส่อง ติดตาม เสนอแนะ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance แต่ในที่นี้จะขอใช้คำว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากในขณะนี้ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการ ได้เริ่มดำเนินการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นแล้ว กล่าวคือ ได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา โดยระเบียบนี้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และตามอำนาจหน้าที่ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่สอดส่อง ติดตาม ประเมินและให้ข้อเสนอแนะตามโครงการ/กิจกรรม แผนงานพัฒนาจังหวัด การลงทุนภาครัฐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การให้บริการที่เป็นสาธารณะอื่น ๆ ที่ต้องยึดมติที่ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) สิงห์บุรี ในการนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี มีความมุ่งหวังว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมโดยหลักธรรมาภิบาลต่อหน่วยงานของภาครัฐและคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วนและประชาชนต่อไป

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

กันยายน ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี	๑ - ๔
ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี	๕ - ๖
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี	
๓.๑ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี	๗ - ๑๔
๓.๒ ผลการสอดส่องโครงการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี	๑๕ - ๕๑
ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี	๕๒



ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

๑.๑. ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ได้บัญญัติว่า รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ดังกล่าวก็เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น

(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

(๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๖ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๓/๑ สำหรับจำนวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับองค์ประกอบของ ก.ธ.จ. จะประกอบด้วยผู้แทนจาก ๓ ภาคส่วน คือ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้กำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการโดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน และมีฝ่ายเลขานุการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้น เป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน โดยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำวาระการประชุมและงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย รวมทั้งจัดทำแผนงานการประชุม ก.ธ.จ.

เพื่อเสนอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นข้าราชการในจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกรรมการในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานที่ประชุมและงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการการกำหนดสัดส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น การจัดทำบัญชีรายชื่อสำรอง ตลอดจนการลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง

๑.๒ อำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ

๑.๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ จำนวนไม่เกินสามคน

(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

๑.๒.๒ การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ๗ ประการ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน

(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

๑.๒.๓ สำหรับกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อำนาจ ก.ธ.จ. ในการออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปรึกษาตามข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ยังได้กำหนดว่า “กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดำเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดำเนินการต่อไป

๑.๓ อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๕๘

เพื่อให้ ก.ธ.จ. ในฐานะที่เป็นองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน มีบทบาทเพิ่มขึ้นในส่วนของการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยกำหนดให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง “การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย” ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. กรณีการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐไว้ดังนี้

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้เป็นดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนหารือในเรื่องดังกล่าว

๒. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐตามแผนงานโครงการใด ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อมีมติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

๓. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เมื่อ ก.ธ.จ. ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) แล้วให้มีผู้แทน ก.ธ.จ. จำนวน ๒ คน ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เข้าร่วมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) สนับสนุนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แทน ก.ธ.จ. ที่ได้รับมอบหมาย

****

ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด ที่ สห ๐๐๑๗.๕/ ๔๑๘๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จำนวน ๖ คน ได้แก่

๑.๑ นางธนิสร แจ้งสนอง

๑.๒ นายทองเหมาะ ชื่นกุศล

๑.๓ นางอรทัย ลาภานันต์

๑.๔ นางดลนภา ร่มโพธิ์

๑.๕ พันโท สุนทร นพกุลสถิตย์

๑.๖ นางจิตรตรี ชัชวาลย์

๒. กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ได้แก่

๒.๑ นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ

๒.๒ ดาบตำรวจ นิเวสน์ สายนาค

๒.๓ นายพะเยาว์ เรืองพงษ์

๓. กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จำนวน ๓ คน ได้แก่

๓.๑ นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช

๓.๒ นายเจษฎา พรหมมาศ

๓.๓ นายเชาวลิต เสตณสหมิตร

สำหรับที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

(๑) ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี	ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
(๒) นายพิจิตร ปัญญาพิชิต	ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
(๓) นายชวดล กรุ่นทอง	ที่ปรึกษาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม



นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี



ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์



นายพิจิตร ปัญญาพิชิต
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ



นายชวดล กรุ่นทอง
ที่ปรึกษาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม



นางอรทัย ลาภานันต์
รองประธาน



นางธนิสร แจ้งสนอง
กรรมการ



นายทองเหมาะ ชื่นกุศล
กรรมการ



นางดลนภา ร่มโพธิ์
กรรมการ



พันโท สุนทร นพกุลสถิตย์
กรรมการ



นางจิตรตรี ชัชวาลย์
กรรมการ



นายธรรมรัตน์ ดีเจริญดีรุ่งฟ
กรรมการ



ดาบตำรวจ นิเวสน์ สายนาค
กรรมการ



นายพะเยาว์ เรืองพงษ์
กรรมการ



นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช
กรรมการ



นายเจษฎา พรหมมาศ
กรรมการ



นายเชาวลิต เสตณสหมิตร
กรรมการ

ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

จากการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ที่มุ่งเน้นการสอดส่องแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนงาน/โครงการในจังหวัด รวมทั้งการดำเนินการในด้านอื่นๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ปัญหา อุปสรรค	รายละเอียด
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี	๑. กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ มีข้อจำกัดในด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่ รวมทั้งในบางกรณีข้อจำกัดด้านเวลา ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการ อาทิ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการในแต่ละครั้งที่กำหนด หากกรรมการที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น ติดภารกิจไม่สามารถดำเนินการสอดส่องได้ กรรมการในส่วนที่เหลือ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่แทน ๒. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ภายในจังหวัดภายใต้กรอบระยะเวลาที่จำกัด ส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ อาจขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการคัดกรองโครงการ ๓. การลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ณ สถานที่ต่างๆ บางกรณีผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้การตรวจสอบวิเคราะห์ของคณะกรรมการกระทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ด้านการประชาสัมพันธ์	จากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่ พบว่า หน่วยงานของรัฐ และประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบถึงความชัดเจนในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ส่งผลให้บางกรณี เกิดความสับสนในการรับรู้ในอำนาจหน้าที่ กล่าวคือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ถูกมองว่าเป็นกลไกการตรวจสอบการดำเนินภารกิจของภาครัฐ ซึ่งที่แท้จริงแล้ว ถือว่า เป็นกลไกภาคประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี (ก.ธ.จ. สิงห์บุรี) ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ทั้งสิ้น ๔ ครั้ง และประชุมเพื่อลงพื้นที่สอดส่องผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ครั้ง ประกอบด้วย

การประชุมแบบเป็นทางการ	
รายการ	**ผลการประชุม**
๑. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑ เป็นประธาน	- ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่องและมีมติให้ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ร่วมกันสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ **โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก** กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชุมชน ๑. กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเสด็จประพาสต้นวัดพรหมเทพาวาส ต. หัวป่า อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี งบประมาณ ๖,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง **โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก** กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๒. งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน งบประมาณ ๔,๒๐๙.๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๓. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๖ จังหวัด และเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล โทรทัศน์ สนามบิน รถไฟฟ้า และสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ งบประมาณ ๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

รายการ	ผลการประชุม
	นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ กิจกรรม ได้แก่ **โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสิงห์บุรี** ๑. กิจกรรม การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ ๑,๐๑๗,๙๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี **โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรี** กิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด ๒. กิจกรรมย่อย การพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อเพิ่มผลผลิต งบประมาณ ๑,๐๒๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ๓. กิจกรรมย่อย การพัฒนาการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินเพื่อเพิ่มผลผลิต งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี **โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากปลา** กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีให้เป็นตลาดประชารัฐที่ได้มาตรฐาน ๔. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ตลาดยงเกียรติ) ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร** กิจกรรม บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ๕. กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคลองบ้านท้ายน้ำ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๓,๑๐๐ ลบ.ม.) งบประมาณ ๔,๙๗๒,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี

รายการ	ผลการประชุม
	๖. กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคลองห้วยชัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ปริมาตรดินขุดไม่น้อยหว่า ๒๘,๗๖๐ ลบ.ม.) งบประมาณ ๔,๗๐๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี ๗. กิจกรรมย่อย ปรับปรุงห้วยสามัคคี ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๒๐๐ ลบ.ม.) งบประมาณ ๔,๙๘๕,๐๐๐ บาท (๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี **โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี** กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๘. กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเตาเผาแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๔,๑๗๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี **โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี** กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร ๙. กิจกรรมย่อย งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี **โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี** กิจกรรม พลังผู้สูงวัยร่วมใจพัฒนาสังคม ๑๐. กิจกรรมย่อย เสริมสร้างพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ งบประมาณ ๕๓๔,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม สร้างลานกีฬาในพื้นที่ ๑๑. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท (๒,๑๓๓,๒๖๔ บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี

รายการ	ผลการประชุม
	กิจกรรม สร้างลานกีฬาในพื้นที่ ๑๒. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๗๗๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี **โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี** กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๑๓. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร) งบประมาณ : ๒๑,๗๗๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี **โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน** กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม ๑๔. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท่าศาลถึงวัดดอกไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ๑๕. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (กว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๕ เมตร) งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒,๔๕๙,๐๐๐ บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปา ๑๖. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีงบประมาณ : ๔,๒๐๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน ๑๗. กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑,๘๒๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี

รายการ	ผลการประชุม
๒. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑ เป็นประธาน	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่สอดส่องโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ **๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๖ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๔๗๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี **๒. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบางคณฑี หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๑๕๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี **๓. โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี** ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่พาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๘๖๕,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี - ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรีและคณะลงพื้นที่สอดส่อง**โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากปลา** กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ให้เป็นตลาดประชารัฐที่ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ตลาดยงเกียรติ) ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการดังกล่าวยังมิได้เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างการเตรียมหาผู้รับจ้างและการอนุมัติใช้พื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งหากผลการดำเนินการแล้วเสร็จจะได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป


รายการ	ผลการประชุม
	ในการนี้ ประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี และคณะ ได้มีข้อเสนอแนะกับท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีดำเนินการใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) ขอให้ถ่ายโอนครุภัณฑ์โครงการพร้อมทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการตั้งงบประมาณบำรุงรักษา (๓) กรณีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งคืน ก.บ.จ. เพื่อจักได้นำไปใช้ในโครงการ Y๒ ที่เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ในพื้นที่ ติดตามสอดส่องความก้าวหน้าของโครงการ
๓. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑ เป็นประธาน	- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรีและคณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ โดยปรากฏผลการสอดส่อง ดังนี้ (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภาคกลางตอนบน ๒ อย่างเป็นระบบ กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสมดุลแหล่งน้ำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (ก่อสร้างฝายบึงพักทัน พร้อมอาคารประกอบ) ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการลงพื้นที่ พบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำเข้ามากัดเซาะ ทำให้ต้องสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงเสาเข็ม ตามแผนกำหนดระยะเขื่อน ๑๙๕ เมตร เนื่องจากผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งไม่ให้เข้าพื้นที่ดำเนินการ ประมาณ ๕๐ เมตรในจุดสิ้นสุดโครงการ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างออกไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาคม และปรับปรุงสัญญาเพิ่มเติม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันตามกำหนดในสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อดำเนินการเสร็จจะส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลโพสังโฆ เป็นผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ คณะกรรมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) หากมีการขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ควรคำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำน้อย จึงควรก่อสร้างเฉพาะในจุดพื้นที่ที่เกิดวิกฤติและสร้างความเสียหายและจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการพังทลายเท่านั้น แต่ถ้าพื้นที่ใดไม่ได้เกิดเหตุวิกฤติและสร้างความเสียหาย ไม่จำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตพื้นถิ่นได้อย่างมีความสุข และควรประสานกรมเจ้าท่าในการก่อสร้างทาง

รายการ	ผลการประชุม
	ขึ้น-ลงแหล่งน้ำตามเขื่อน เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการรุกล้ำลำน้ำ (๒) เน้นย้ำการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนและเขื่อน ควรได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานเจ้าของหรือประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนก่อนการอนุมัติโครงการ เพื่อป้องกันการไม่สามารถดำเนินโครงการ หรือการคัดค้านจากประชาชน เช่น ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ หรือพื้นที่ของ อบต. จึงควรทำประชาคมในพื้นที่อย่างเข้มข้นและชัดเจน อีกทั้งต้องตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำน้อยหมู่ที่ ๕ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการลงพื้นที่ พบว่า เป็นการก่อสร้างทดแทนฝายเดิมที่ถูกน้ำกัดเซาะหูฝายขาด น้ำไหลลงคลองระบายน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำที่มาจากชัยนาทได้ จากปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณที่ขาดไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการต่อเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีสามารถใช้น้ำในฤดูแล้งและน้ำหลากได้ตลอดทั้งปี และควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของบึงพักทัน สำหรับดินที่ได้จากการขุดลอกให้นำมาเสริมคันดินเพื่อทำถนนบริเวณโดยรอบ ในการนี้ คณะกรรมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีข้อเสนอแนะ ว่า การสร้างฝายสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และสามารถกักเก็บน้ำได้ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. แต่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของฝายให้เต็มศักยภาพ ควรมีการต่อยอดโดยการขุดลอกบึงพักทันเพิ่มตลอดเส้นทาง ประมาณ ๔ กิโลเมตร จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ประชาชนจำด้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
๔. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑ เป็นประธาน	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี มีหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรับทราบผลการดำเนินการ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ๑. ผลการสอดส่องโครงการแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑.๑ กลุ่มที่ ๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและไม่พบปัญหา ๑.๒ กลุ่มที่ ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

รายการ	ผลการประชุม
	๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนที่ยังไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากรอผลการตรวจสอบคุณภาพยาง ขอให้จังหวัดประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการอย่างใกล้ชิด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒. กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำ ณ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการออกแบบพนังกั้นน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับภูมิทัศน์โดยรอบ เนื่องจาก ๒ ฝั่งแม่น้ำมีความเป็นธรรมชาติสูง สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนได้อีกทางหนึ่ง

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี
จำนวน ๑๑ ครั้ง ตามลำดับวันที่ลงพื้นที่สอดส่อง

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร กิจกรรมย่อย งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดการจัดงานครั้งนี้ เน้นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการจัดงาน สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเป็นประชาชนนอกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ก.ธ.จ. สิงห์บุรี จะได้ติดตามการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดจากโครงการฯ และนำเสนอที่ประชุมต่อไป

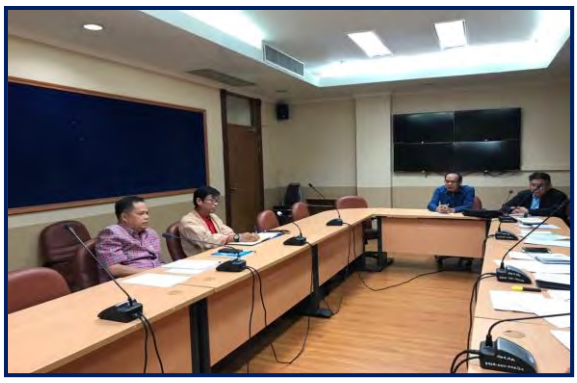

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางทำบุญไหว้พระ (วัดพิกุลทอง) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับประชาชน อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ ๓ ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์เข้าอาคาร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. เห็นควร กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพราะภายในประกอบด้วยวัตถุ รวมทั้งสิ่งของมีค่าที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายหรือสูญหายได้ ๒. ด้านความคุ้มค่า เสนอให้ภายหลังจากการเปิดพิพิธภัณฑ์ ควรมีการสร้างแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่









วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภาคกลางตอนบน ๒ อย่างเป็นระบบ กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสมดุลแหล่งน้ำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ กิจกรรมย่อย ก่อสร้างฝายบึงพักทัน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำไว้ในบึงพักทันได้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องหยุดดำเนินโครงการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน









วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากปลา กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีให้เป็นตลาดประชารัฐที่ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ตลาดยงเกียรติ) ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างการเตรียมหาผู้รับจ้างและการอนุมัติใช้พื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควร ให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด









วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคลองบ้านท้ายน้ำ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ปริมาตรดินขุดไม่น้อยหว่า ๕๓,๑๐๐ ลบ.ม.) งบประมาณ ๔,๙๗๒,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญาที่กำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนด









วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน งบประมาณ ๔,๒๐๙,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย









วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร) งบประมาณ ๒๑,๗๗๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ในพื้นที่ เนื่องจากผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งแจ้งยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ ไม่ยินยอมให้ดำเนินการ









วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ ๑,๐๑๗,๙๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างทำสัญญาหาผู้รับจ้างโดยดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จัดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ใช้งบประมาณ ๘ แสนบาท ผู้ประกอบมีรายได้กลับมา ๑.๒ ล้านบาท ครั้งที่ ๒ กำหนด จัดที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ควรมีการกระจายหาผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม










วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด กิจกรรมย่อย การพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อเพิ่มผลผลิต งบประมาณ ๑,๐๒๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามตัวชี้วัด ไม่มีการร้องเรียน



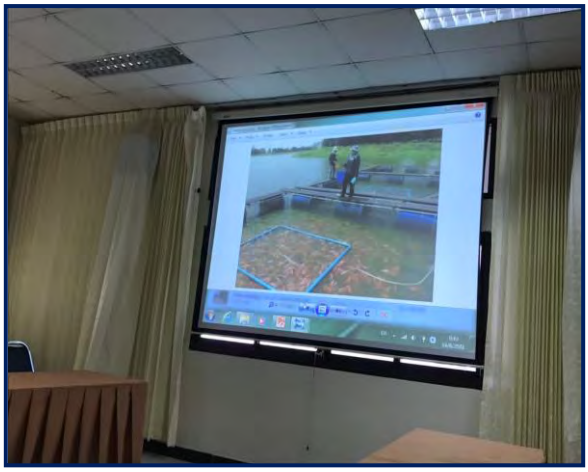





วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด กิจกรรมย่อย การพัฒนาการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินเพื่อเพิ่มผลผลิต งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามตัวชี้วัด ไม่มีการร้องเรียน









วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย ปรับปรุงห้วยสามัคคี ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๒๐๐ ลบ.ม.) งบประมาณ ๔,๙๘๕,๐๐๐ บาท (๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามตัวชี้วัด มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ ไม่มีการร้องเรียน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๔) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเตาเผาแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๔,๑๗๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ขณะลงพื้นที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ และจากการสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบว่า ขณะนี้กรมศิลปากรจะนำแบบไปปรับปรุงแก้ไข **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควรลงพื้นที่ติดตามสอดส่อง อย่างใกล้ชิด

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชุมชน กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเสด็จประพาสต้น วัดพรหมเทพาวาส ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยวิธี e-bidding แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ครั้ง **จึงได้ยกเลิกโครงการ**






วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม สร้างลานกีฬาในพื้นที่ กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท (๒,๑๓๓,๒๖๔ บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้ ๑. โครงการสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ๒. ผลสำเร็จของโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดในโครงการ ๓. ไม่มีการร้องเรียน และประชาชนมีความพึงพอใจ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. ด้านการบริหารจัดการเสนอให้บริหารจัดการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๒. ด้านความคุ้มค่า เสนอให้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมประจำและแผนพัฒนาต่อยอดร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่





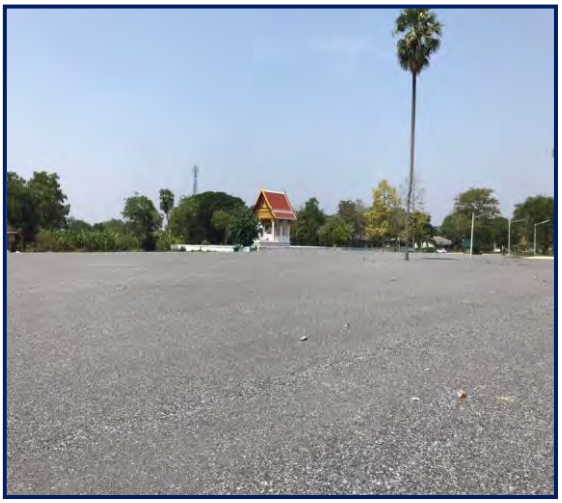



วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๓) โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (กว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๕ เมตร) งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒,๔๕๙,๐๐๐ บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้สะดวก









วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่าศาลถึงวัดดอกไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา รวมทั้งผลสำเร็จของโครงการเป็นไป ตามตัวชี้วัด ตลอดจนไม่มีการร้องเรียน และประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ









วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปา กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑,๘๒๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ระบบประปาสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เดินท่อประปาตัวเก่าถึงประปาตัวใหม่









วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๓) โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่พาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๘๖๕,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพยางพาราแอสฟัลท์ติกของผู้รับเหมา **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. เห็นควร ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. งบประมาณและราคาประมูลห่างกันมาก เห็นควรสอดส่องและติดตาม ทั้งนี้ มอบหมายให้ ก.ธ.จ.สิงห์บุรี (ที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภออินทร์บุรี) ดำเนินการสอดส่องและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป









วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๔) โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปา กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๔,๒๐๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เดินท่อประปาตัวเก่าถึงประปาตัวใหม่





วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคลองห้วยชัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๘,๗๖๐ ลบ.ม.) งบประมาณ ๔,๗๐๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้ว คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ ๘๕









วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางคณฑี หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๑๕๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพยางพาราแอสฟัลท์ติกของผู้รับเหมา ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบ ให้ดำเนินการแจ้ง ก.ธ.จ.สิงห์บุรี (ที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี) ทราบทันทีเมื่อเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการสอดส่องและติดตามความคืบหน้าต่อไป





วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๓) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม พลังผู้สูงวัยร่วมใจพัฒนาสังคม กิจกรรมย่อย เสริมสร้างพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ งบประมาณ ๕๓๔,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในทุกอำเภอ รวมทั้งผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามตัวชี้วัด และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่
(๔) โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๖ จังหวัด และเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล โทรทัศน์ สนามบิน รถไฟฟ้า และสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ งบประมาณ ๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้ว แต่คุณภาพ และรายละเอียดของงานไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของจังหวัดที่ระบุไว้ใน TOR ในการนี้ จังหวัดจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม และกำหนดให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดที่ระบุใน TOR ใหม่ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของจังหวัด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ทราบว่าภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะสามารถดำเนินการเปิดซองสอบราคา





วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๖ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๔๗๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และโครงการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทราบว่า โครงการดังกล่าวมีกำหนดดำเนินการก่อสร้างภายใน๔-๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ก.ธ.จ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. พื้นที่ริมแม่น้ำ แต่กำลังสร้างผนังกั้นน้ำด้วยจึงน่าจะแข็งแรงดี ๒.งบประมาณและราคาประมูลห่างกันมาก เห็นสมควรสอดส่องใกล้ชิด









วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางทำบุญไหว้พระ (วัดพิกุลทอง) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ มีความพร้อมในการเปิดให้บริการสาธารณะ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. เห็นควร กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพราะภายในประกอบด้วยวัตถุ รวมทั้งสิ่งของมีค่าที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายหรือสูญหายได้ ๒. ด้านความคุ้มค่า เสนอให้ภายหลังจากการเปิดพิพิธภัณฑ์ควรมีการสร้างแผนงานการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่









วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๓) โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปา กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๔,๒๐๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการแล้ว คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ ๒๐ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. เห็นควร ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ๒. เห็นควร มอบหมายให้ ก.ธ.จ.สิงห์บุรี (ที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอบางระจัน) ดำเนินการสอดส่องและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป ๓. เห็นควร ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบและบริหารจัดการรายละเอียดในโครงการเพื่อให้เกิดความถูกต้องและสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที









วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๔) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากปลา กิจกรรม: ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีให้เป็นตลาดประชารัฐที่ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ตลาดยงเกียรติ) ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้ว คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ ๒๕ ซึ่งอยู่ในงวดที่ ๒ ของการดำเนินการ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควร ให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด









วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร) งบประมาณ ๒๑,๗๗๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่มีน้ำเข้ามากัดเซาะ ทำให้ต้องสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงเสาเข็มตามแผนกำหนดระยะเขื่อน ๑๙๕ เมตร เนื่องจากผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งไม่ให้เข้าพื้นที่ดำเนินการ ประมาณ ๕๐ เมตร ในจุดสิ้นสุดโครงการ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างออกไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาคมและปรับปรุงสัญญาเพิ่มเติม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันตามกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อดำเนินการเสร็จจะส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลโพสังโฆเป็นผู้บริหารจัดการ และบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. หากมีการขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ควรคำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำน้อย จึงควรก่อสร้างเฉพาะในจุดพื้นที่ที่เกิดวิกฤติและสร้างความเสียหายและจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการพังทลายเท่านั้น แต่ถ้าพื้นที่ใดไม่ได้เกิดเหตุวิกฤติและสร้างความเสียหาย ไม่จำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตพื้นถิ่นได้อย่างมีความสุข และควรประสานกรมเจ้าท่าในการก่อสร้างทางขึ้น-ลงแหล่งน้ำตามเขื่อน เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการรุกล้ำลำน้ำ ๒. เน้นย้ำการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนและเขื่อน ควรได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานเจ้าของหรือประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนก่อน การอนุมัติโครงการเพื่อป้องกันการไม่สามารถดำเนินโครงการ หรือการคัดค้านจากประชาชน เช่น ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ หรือพื้นที่ของ อบต. จึงควรทำประชาคมในพื้นที่อย่างเข้มข้น และชัดเจน อีกทั้งต้องตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่





วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภาคกลางตอนบน ๒ อย่างเป็นระบบ กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสมดุลแหล่งน้ำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ กิจกรรมย่อย ก่อสร้างฝายบึงพักทัน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าว เป็นการก่อสร้างทดแทนฝายเดิมที่ถูกน้ำกัดเซาะหูฝายขาด น้ำไหลลงคลองระบายน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำที่มาจากชัยนาทได้ จากปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณที่ขาดไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการต่อ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีสามารถใช้น้ำในฤดูแล้งและน้ำหลากได้ตลอดทั้งปี และควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของบึงพักทัน สำหรับดินที่ได้จากการขุดลอกให้นำมาเสริมคันดินเพื่อทำถนนบริเวณโดยรอบ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** การสร้างฝายสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และสามารถกักเก็บน้ำได้ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. แต่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของฝายให้เต็มศักยภาพ ควรมีการต่อยอดโดยการขุดลอกบึงพักทันเพิ่มตลอดเส้นทาง ประมาณ ๔ กิโลเมตร จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่









วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๖ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๔๗๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินการแล้วมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ ๘๐ แต่พบว่า มีประชาชนร้องเรียน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการมีประชาชนใช้ถนนในการสัญจรไปมาเป็นระยะเวลาลานมากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งสภาพพื้นที่ถนนน่าจะเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว แต่เมื่อเข้าไปดำเนินโครงการปรากฏว่ามีประชาชนซึ่งมีที่ดินอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้อ้างกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินบริเวณที่ดินพื้นที่ที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ ยาว ๓๗ เมตร กว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ คสล. ๗๔ ตารางเมตร ซึ่งอำเภอพรหมบุรีได้แก้ไขปัญหา ดังนี้ (๑) แจ้งองค์การาบริหารส่วนตำบลพระงาม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขต (๒) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างควบคุมงานได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมมีมติให้ระงับการก่อสร้างพื้นที่บริเวณที่มีปัญหา และไปดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกันกับถนนที่ดำเนินโครงการ โดยถนนที่ดำเนินการเพิ่มระยะทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ คสล. ๗๖ ตารางเมตร (๓) เมื่อรวมพื้นที่โครงการทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ คสล. ทั้งสิ้นจำนวน ๔,๐๐๒ ตารางเมตร **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** ๑. พื้นที่ริมแม่น้ำ แต่กำลังสร้างผนังกั้นน้ำด้วยจึงน่าจะแข็งแรงดี ๒. งบประมาณและราคาประมูลห่างกันมาก เห็นสมควรสอดส่องใกล้ชิด ๓. ให้ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามความคืบหน้าต่อไป





วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร) งบประมาณ ๒๑,๗๗๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินการแล้วมีความคืบหน้า ดังนี้ (๑) ระยะเวลาดำเนินการ - ระยะเวลาตามสัญญา ๓๘๐ วัน - ดำเนินการมาแล้ว ๑๘๙ วัน (ร้อยละ ๔๙.๗๔) - คงเหลือ ๑๙๑ วัน (ร้อยละ ๕๐.๒๖) (๒) ผลการปฏิบัติงาน - แผนงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๕๘.๗๐๓ - ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๓๐๒.๗๒๕ - ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๒๗.๙๗๘ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควร ให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป










วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๓) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเตาเผาแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๔,๑๗๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	**(๑) งานปรับปรุงเตาเผาแม่น้ำน้อย (งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)** <u>ลักษณะการปฏิบัติงาน</u> ๑) งานปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารหมายเลข ๒, ๓ ๒) งานหลังคาอาคารจัดแสดงหมายเลข ๑ รื้อถอน+ทำความสะอาด+มุงใหม่ กระเบื้องมุงหลังคา และมุงกระเบื้องหลังคาเพิ่มเติมในส่วนที่ชำรุด <u>การดำเนินการ</u> เสร็จสิ้นเรียบร้อย และเบิกจ่ายแล้ว (มีงบประมาณคงเหลือ ๑๕๕,๓๓๐ บาท) **(๒) งานอนุรักษ์เตาเผาแม่น้ำน้อย** ๑) งานจ้างเหมาอนุรักษ์เตาเผาแม่น้ำน้อย <u>ลักษณะการปฏิบัติงาน</u> ๑) งานการกำจัดจุลชีพและจัดทำแผนผังการเสื่อมสภาพ ๒) งานการลดปริมาณเกลือที่ละลายน้ำในเนื้อวัสดุ ๓) งานการลดปริมาณความชื้นระบบคลื่น ๔) งานการเสริมความแข็งแรงของพื้นผิวอิฐ ผนังดิน ๕) งานการปรับสภาพพื้นผิวให้มีความกลมกลืน ๖) การวิเคราะห์วัสดุด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ๗) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของอิฐและเนื้อดิน ๘) การถ่ายภาพแบบสามมิติ และ Photogtammetry ๙) การเจาะตรวจระดับน้ำใต้ดิน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามายื่นข้อเสนอกับจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้พิจารณายกเลิกการจัดจ้างงานจ้างเหมางานอนุรักษ์เตาเผาแม่น้ำน้อย โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๗๕ วรรคสอง และดำเนินการจัดจ้างใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) โดยได้แต่งตั้งบุคลากรจากกรมศิลปากร กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ เป็นคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้ รอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรง และจัดทำหนังสือเชิญชวนให้มายื่นเสนอราคา ๒) ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับงานอนุรักษ์ฯ ๒ เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน จำนวน ๑ ชุด **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควร ให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

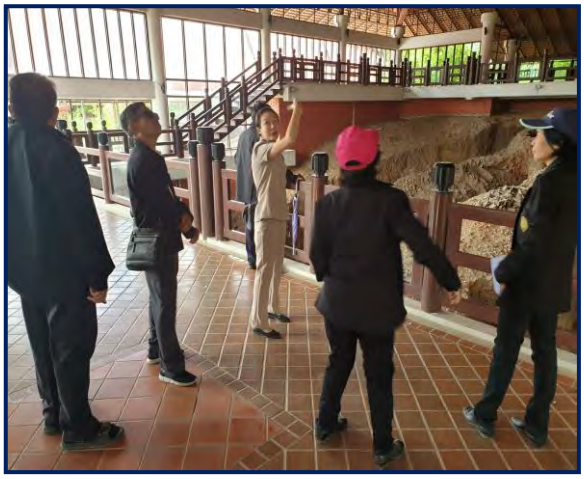




จังหวัดสิงห์บุรี







วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๔) โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปา กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๔,๒๐๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้า มากกว่าร้อยละ ๘๐ และคาดว่าว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** (๑) ควรจัดทำป้ายโครงการให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ถูกต้อง (๒) เห็นควร ให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป









วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๕) โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่พาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๘๖๕,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพยางพาราแอสฟัลท์ติก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจากกรมทางหลวง **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** (๑) เห็นควรเสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบคุณภาพยางพาราแอสฟัลท์ติก มายังจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว (๒) เห็นควร ให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป





วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคลองห้วยชัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ปริมาตรดินขุดไม่น้อยหว่า ๒๘,๗๖๐ ลบ.ม.) งบประมาณ ๔,๗๐๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนแต่อย่างด









วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๗) โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบางคณฑี หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๑๕๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวมีผลความคืบหน้าในการดำเนินการร้อยละ ๒๙.๑๐ ผลงานคงเหลือ ร้อยละ ๗๐.๙๐ **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควร ให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป









วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๘) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากปลา กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีให้เป็นตลาดประชารัฐที่ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ตลาดยงเกียรติ) ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้ว คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ ๓๐ ซึ่งอยู่ในงวดที่ ๒ ของการดำเนินการ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการติดตั้งฐานรากและตอม่อของอาคาร **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควร ให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป









วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
โครงการ/กิจกรรม	**ผลการสอดส่อง/ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต**
(๙) โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๖ จังหวัด และเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล โทรทัศน์ สนามบิน รถไฟฟ้า และสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ งบประมาณ ๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	**ผลการสอดส่อง** พบว่า โครงการดังกล่าว ผู้รับจ้างจะได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ ๑ ทั้งนี้ เมื่อได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางป้าย billboard ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และคาดการณ์ว่า จะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ บนรถไฟฟ้า สนามบิน ในช่วงเดือนกันยายน **ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต** เห็นควร ให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป





คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

๑. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี
๒. นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี
๓. นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

คณะผู้จัดทำ

๑. นายณัฏฐกร วัธโท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี
๒. นายสิทธิ ลิมปะพันธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๓. นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน	พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๔. นางสาวสุพัตรา ชุดทองม้วน	พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

****
